
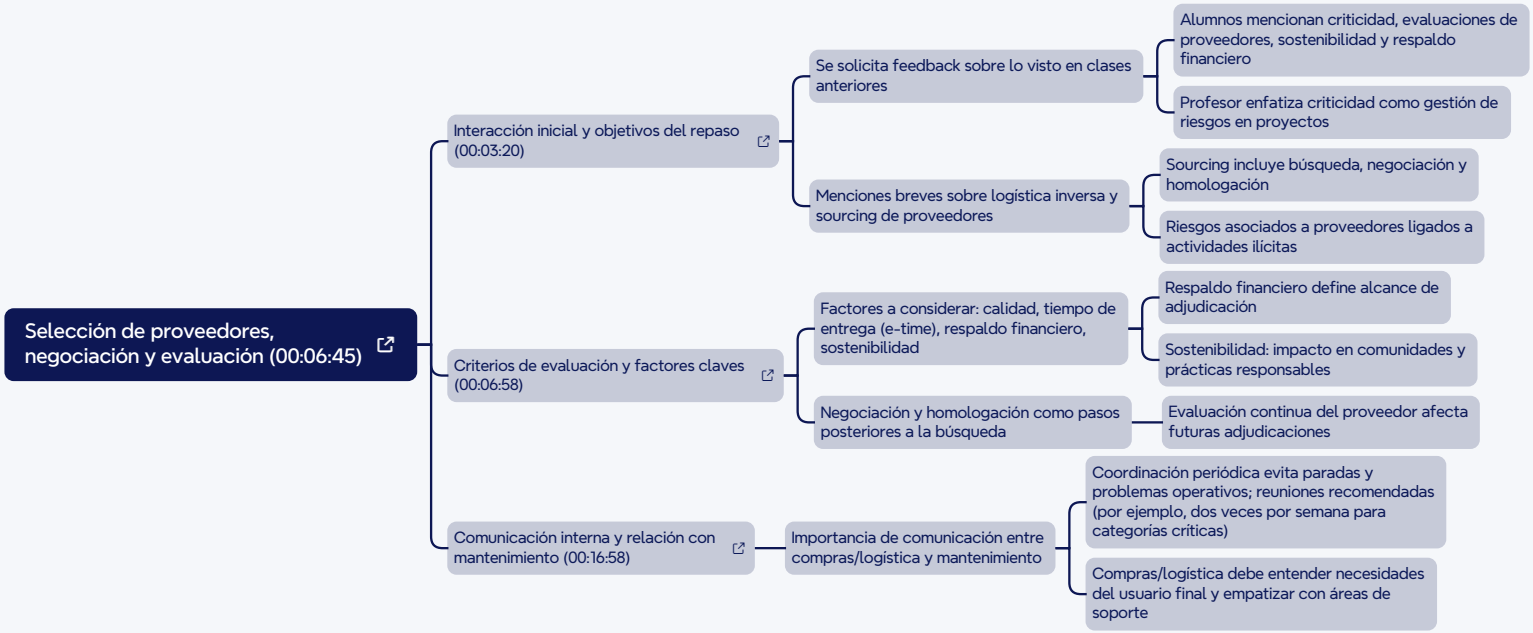
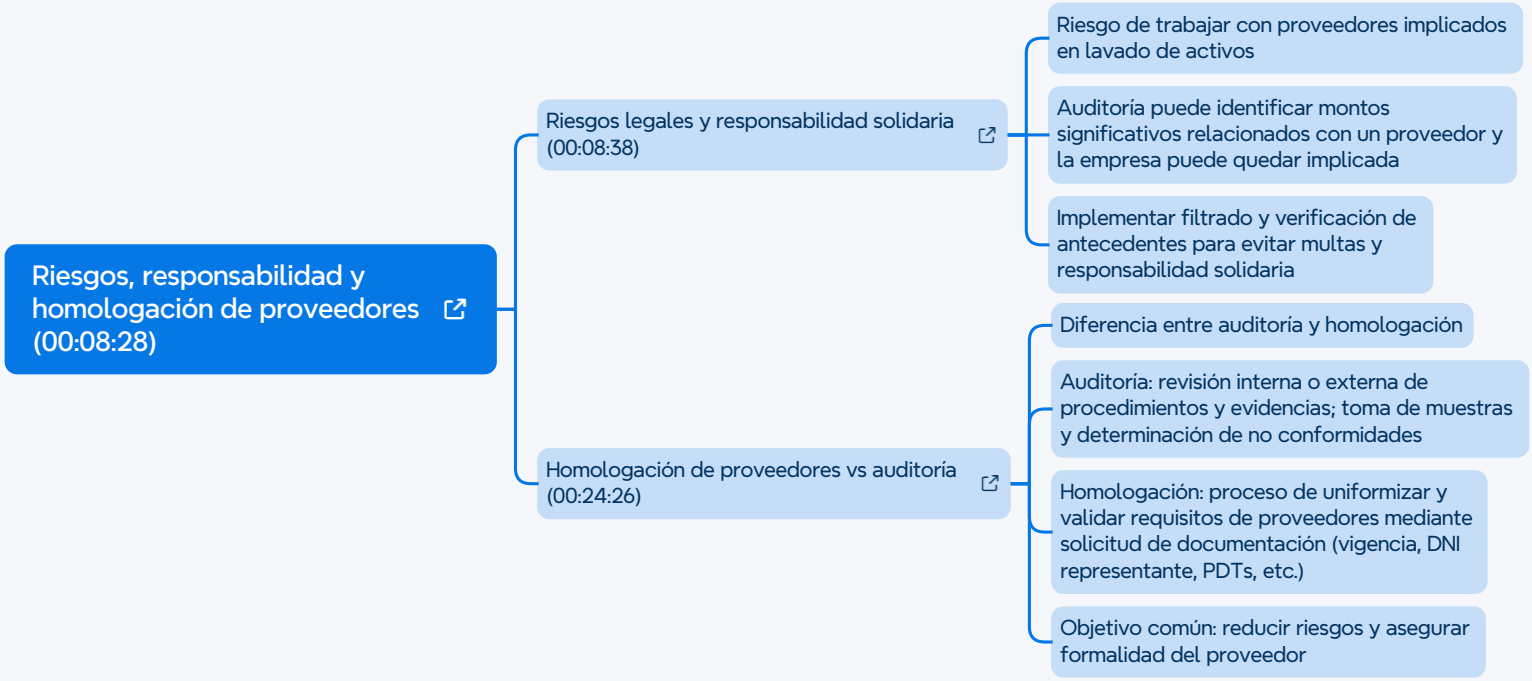
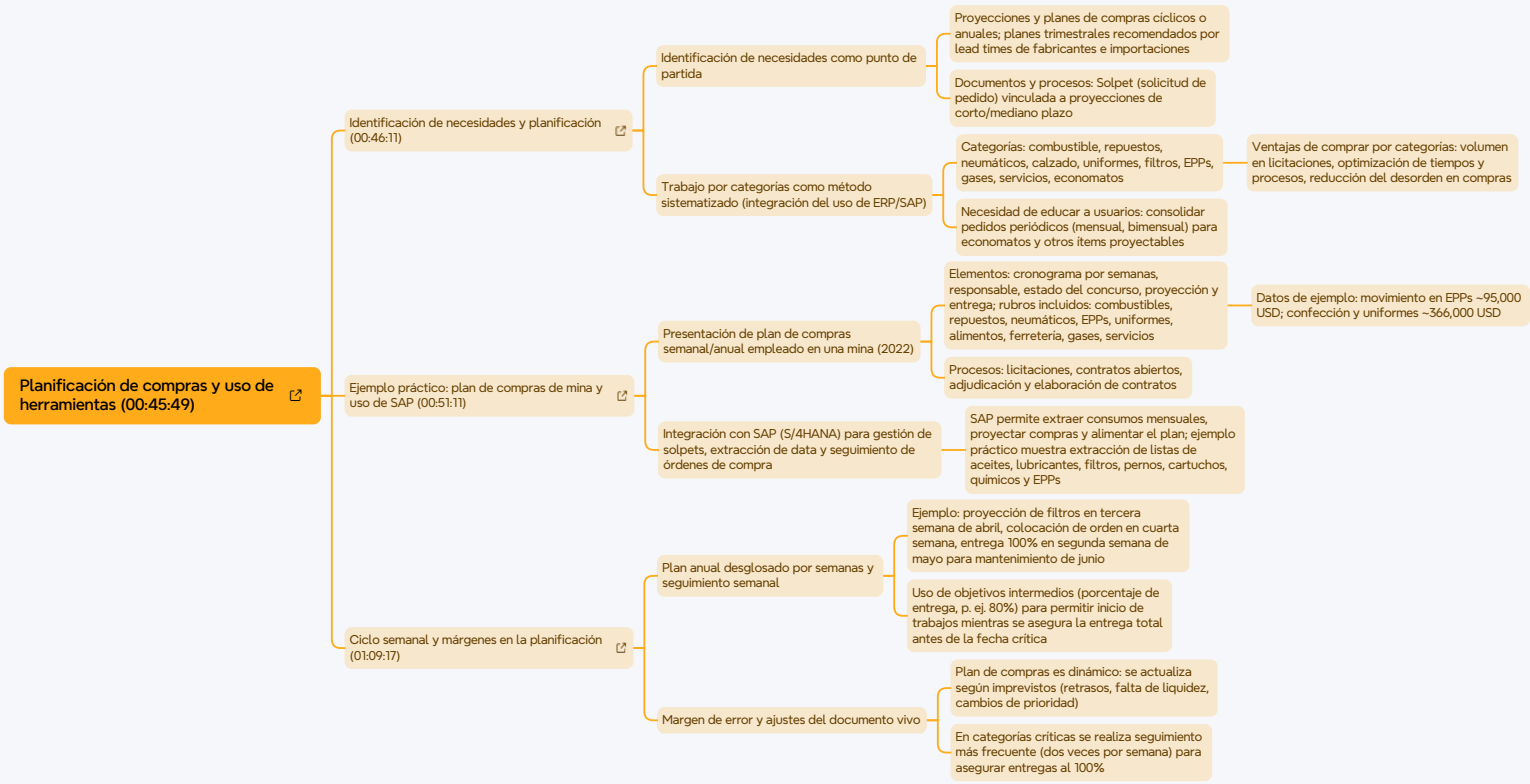
EDU MIN

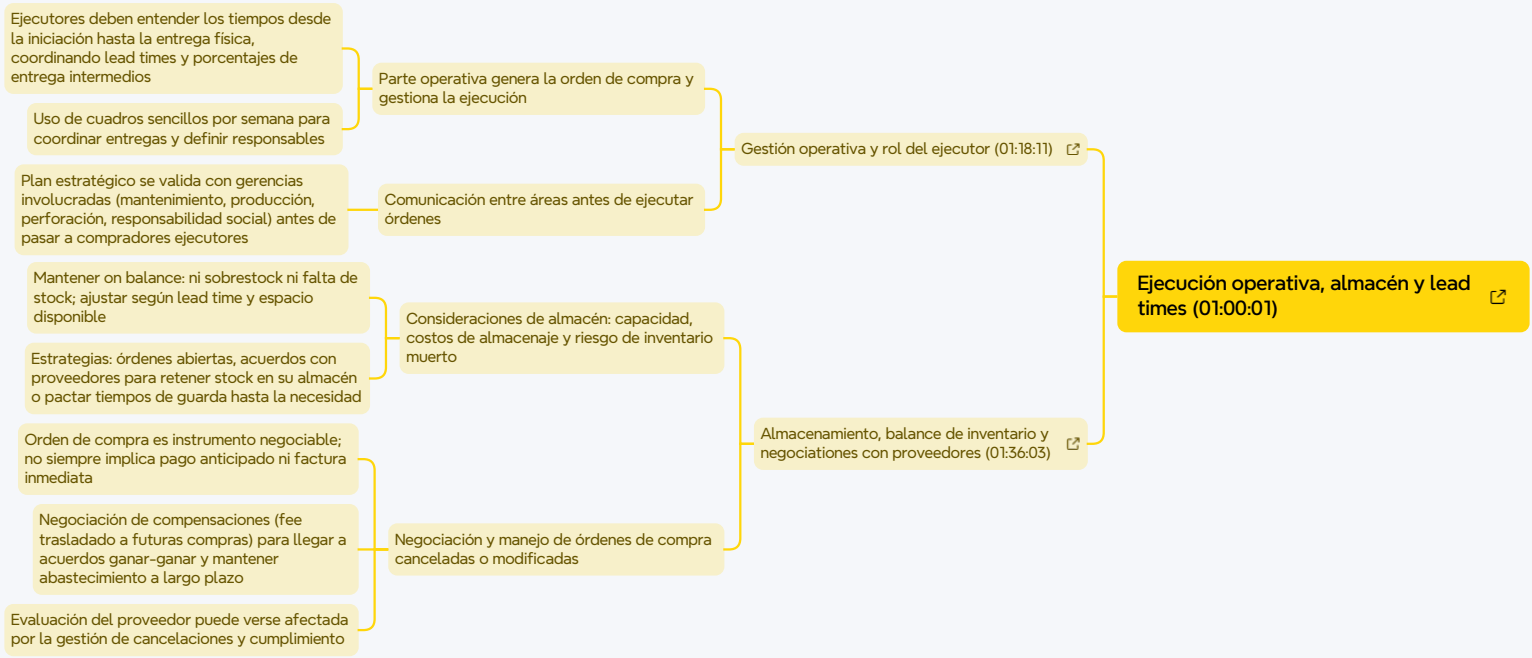

CLASE 03: PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y APROVISIONAMIENTO EN MINERÍA - 1RA PARTE
Presupuestos, coordinación interáreas y decisiones estratégicas (01:30:34)
Buenas prácticas finales y cierre (01:22:44)
Ejecución operativa, almacén y lead times (01:00:01)
Selección de proveedores, negociación y evaluación (00:06:45)
Riesgos, responsabilidad y homologación de proveedores (00:08:28)
Planificación de compras y uso de herramientas (00:45:49)

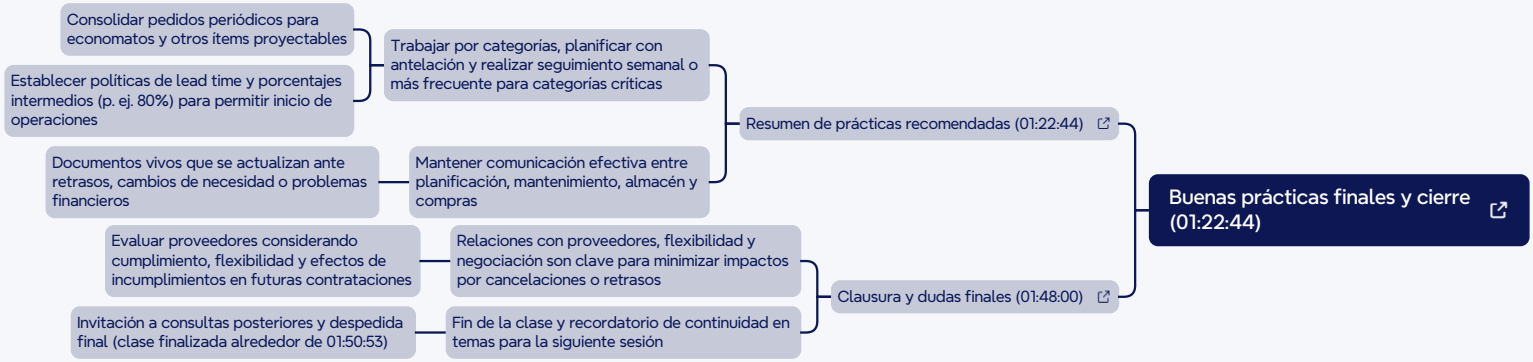

Selección de proveedores, negociación y evaluación (00:06:45)
Interacción inicial y objetivos del repaso (00:03:20)
Se solicita feedback sobre lo visto en clases anteriores
Alumnos mencionan criticidad, evaluaciones de proveedores, sostenibilidad y respaldo financiero
Profesor enfatiza criticidad como gestión de riesgos en proyectos
Menciones breves sobre logística inversa y sourcing de proveedores
Sourcing incluye búsqueda, negociación y homologación
Riesgos asociados a proveedores ligados a actividades ilícitas
Criterios de evaluación y factores claves (00:06:58)
Factores a considerar: calidad, tiempo de entrega (e-time), respaldo financiero, sostenibilidad
Respaldo financiero define alcance de adjudicación
Sostenibilidad: impacto en comunidades y prácticas responsables
Negociación y homologación como pasos posteriores a la búsqueda
Evaluación continua del proveedor afecta futuras adjudicaciones
Comunicación interna y relación con mantenimiento (00:16:58)
Importancia de comunicación entre compras/logística y mantenimiento
Coordinación periódica evita paradas y problemas operativos; reuniones recomendadas (por ejemplo, dos veces por semana para categorías críticas)
Compras/logística debe entender necesidades del usuario final y empatizar con áreas de soporte

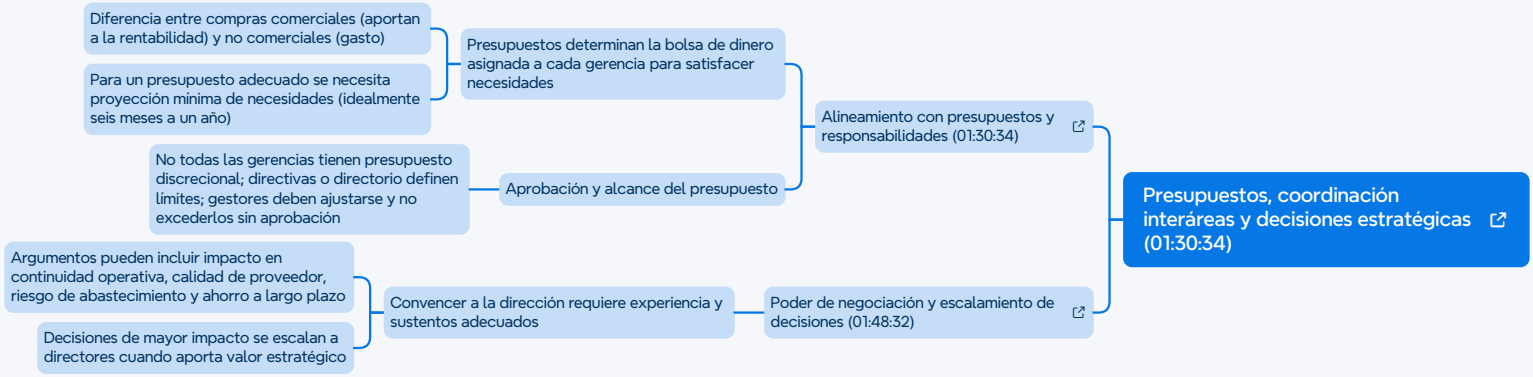

Riesgos, responsabilidad y homologación de proveedores (00:08:28)
Riesgos legales y responsabilidad solidaria (00:08:38)
Riesgo de trabajar con proveedores implicados en lavado de activos
Auditoría puede identificar montos significativos relacionados con un proveedor y la empresa puede quedar implicada
Implementar filtrado y verificación de antecedentes para evitar multas y responsabilidad solidaria
Homologación de proveedores vs auditoría (00:24:26)
Diferencia entre auditoría y homologación
Auditoría: revisión interna o externa de procedimientos y evidencias; toma de muestras y determinación de no conformidades
Homologación: proceso de uniformizar y validar requisitos de proveedores mediante solicitud de documentación (vigencia, DNI representante, PDTs, etc.)
Objetivo común: reducir riesgos y asegurar formalidad del proveedor

EDU MIN


Planificación de compras y uso de herramientas (00:45:49)
Identificación de necesidades y planificación (00:46:11)
Identificación de necesidades como punto de partida
Proyecciones y planes de compras cíclicos o anuales; planes trimestrales recomendados por lead times de fabricantes e importaciones
Documentos y procesos: Solpet (solicitud de pedido) vinculada a proyecciones de corto/mediano plazo
Trabajo por categorías como método sistematizado (integración del uso de ERP/SAP)
Categorías: combustible, repuestos, neumáticos, calzado, uniformes, filtros, EPPs, gases, servicios, economatos
Ventajas de comprar por categorías: volumen en licitaciones, optimización de tiempos y procesos, reducción del desorden en compras
Necesidad de educar a usuarios: consolidar pedidos periódicos (mensual, bimensual) para economatos y otros ítems proyectables
Ejemplo práctico: plan de compras de mina y uso de SAP (00:51:11)
Presentación de plan de compras semanal/anual empleado en una mina (2022)
Elementos: cronograma por semanas, responsable, estado del concurso, proyección y entrega; rubros incluidos: combustibles, repuestos, neumáticos, EPPs, uniformes, alimentos, ferretería, gases, servicios
Datos de ejemplo: movimiento en EPPs ~95,000 USD; confección y uniformes ~366,000 USD
Procesos: licitaciones, contratos abiertos, adjudicación y elaboración de contratos
Integración con SAP (S/4HANA) para gestión de solpets, extracción de data y seguimiento de órdenes de compra
SAP permite extraer consumos mensuales, proyectar compras y alimentar el plan; ejemplo práctico muestra extracción de listas de aceites, lubricantes, filtros, pernos, cartuchos, químicos y EPPs
Ciclo semanal y márgenes en la planificación (01:09:17)
Plan anual desglosado por semanas y seguimiento semanal
Ejemplo: proyección de filtros en tercera semana de abril, colocación de orden en cuarta semana, entrega 100% en segunda semana de mayo para mantenimiento de junio
Uso de objetivos intermedios (porcentaje de entrega, p. ej. 80%) para permitir inicio de trabajos mientras se asegura la entrega total antes de la fecha crítica
Margen de error y ajustes del documento vivo
Plan de compras es dinámico: se actualiza según imprevistos (retrasos, falta de liquidez, cambios de prioridad)
En categorías críticas se realiza seguimiento más frecuente (dos veces por semana) para asegurar entregas al 100%


Ejecución operativa, almacén y lead times (01:00:01)
Gestión operativa y rol del ejecutor (01:18:11)
Parte operativa genera la orden de compra y gestiona la ejecución
Ejecutores deben entender los tiempos desde la iniciación hasta la entrega física, coordinando lead times y porcentajes de entrega intermedios
Uso de cuadros sencillos por semana para coordinar entregas y definir responsables
Comunicación entre áreas antes de ejecutar órdenes
Plan estratégico se valida con gerencias involucradas (mantenimiento, producción, perforación, responsabilidad social) antes de pasar a compradores ejecutores
Almacenamiento, balance de inventario y negociationes con proveedores (01:36:03)
Consideraciones de almacén: capacidad, costos de almacenaje y riesgo de inventario muerto
Mantener on balance: ni sobrestock ni falta de stock; ajustar según lead time y espacio disponible
Estrategias: órdenes abiertas, acuerdos con proveedores para retener stock en su almacén o pactar tiempos de guarda hasta la necesidad
Negociación y manejo de órdenes de compra canceladas o modificadas
Orden de compra es instrumento negociable; no siempre implica pago anticipado ni factura inmediata
Negociación de compensaciones (fee trasladado a futuras compras) para llegar a acuerdos ganar-ganar y mantener abastecimiento a largo plazo
Evaluación del proveedor puede verse afectada por la gestión de cancelaciones y cumplimiento


Buenas prácticas finales y cierre (01:22:44)
Resumen de prácticas recomendadas (01:22:44)
Trabajar por categorías, planificar con antelación y realizar seguimiento semanal o más frecuente para categorías críticas
Consolidar pedidos periódicos para economatos y otros ítems proyectables
Establecer políticas de lead time y porcentajes intermedios (p. ej. 80%) para permitir inicio de operaciones
Mantener comunicación efectiva entre planificación, mantenimiento, almacén y compras
Documentos vivos que se actualizan ante retrasos, cambios de necesidad o problemas financieros
Clausura y dudas finales (01:48:00)
Relaciones con proveedores, flexibilidad y negociación son clave para minimizar impactos por cancelaciones o retrasos
Evaluar proveedores considerando cumplimiento, flexibilidad y efectos de incumplimientos en futuras contrataciones
Fin de la clase y recordatorio de continuidad en temas para la siguiente sesión
Invitación a consultas posteriores y despedida final (clase finalizada alrededor de 01:50:53)


Presupuestos, coordinación interáreas y decisiones estratégicas (01:30:34)
Alineamiento con presupuestos y responsabilidades (01:30:34)
Presupuestos determinan la bolsa de dinero asignada a cada gerencia para satisfacer necesidades
Diferencia entre compras comerciales (aportan a la rentabilidad) y no comerciales (gasto)
Para un presupuesto adecuado se necesita proyección mínima de necesidades (idealmente seis meses a un año)
Aprobación y alcance del presupuesto
No todas las gerencias tienen presupuesto discrecional; directivas o directorio definen límites; gestores deben ajustarse y no excederlos sin aprobación
Poder de negociación y escalamiento de decisiones (01:48:32)
Convencer a la dirección requiere experiencia y sustentos adecuados
Argumentos pueden incluir impacto en continuidad operativa, calidad de proveedor, riesgo de abastecimiento y ahorro a largo plazo
Decisiones de mayor impacto se escalan a directores cuando aporta valor estratégico
